COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO PER LA REGIONE BASILICATA
(D.P.C.M. 21 gennaio 2011)

Accordo di Programma

"Programmazione e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"

tra il

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e la

Regione Basilicata

sottoscritto in data 14 dicembre 2010

Atto integrativo

sottoscritto in data 14.06.2011

Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012

(G.U. n. 121 del 25.05.2012)

RELAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013

INDICE

1. INTRODUZIONE
2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013
3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA DAL COMMISSARIO
4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO
5. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 31 DICEMBRE 2013
6. QUESTIONI DI BILANCIO RELATIVE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE
7. GRAFICI DI SINTESI
8. CRITICITÀ

1. INTRODUZIONE

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Basilicata hanno stipulato, in data il 14 dicembre 2011, un **Accordo di Programma** (allegato n. 1) finalizzato alla *"Programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico"* da effettuare nel territorio della Regione Basilicata nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2 della legge 191/2009.

Gli interventi programmati sono volti prioritariamente alla salvaguardia della vita umana attraverso la riduzione del rischio idraulico, di frana e di difesa della costa, sia mediante la realizzazione di nuove opere, sia con azioni di manutenzione ordinaria che straordinaria.

In particolare gli interventi, da realizzare nell'ambito dell'AdP "Difesa del Suolo", rientrano nella proposta di programmazione regionale che tiene conto delle numerose richieste pervenute agli Uffici della Regione Basilicata oltre che di quelle pervenute direttamente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare o alla Protezione civile nazionale e/o regionale.

Sulla base di dette richieste sono stati selezionati e catalogati, in relazione alla priorità, oltre trecentotrenta interventi, per un fabbisogno totale di circa 300 milioni di Euro.

In relazione alle disponibilità finanziarie, all'epoca, attingibili dalla legge n.191 del 2009, nell'ambito del Piano straordinario previsto dal comma 240 dell'art. 2, sono stati individuati da parte del MATTM, della Regione Basilicata e della Protezione Civile i primi 85 interventi che l'accordo di programma ha indicato nell'allegato - elenco "A", come finanziabili, per un importo complessivo di €. 26.935.000,00.

L'atto integrativo sottoscritto in data 14.06.2011 ha inteso inserire nella programmazione altri 21 interventi con la previsione di un ulteriore finanziamento di €. 8.269.000,00 da gravare sull'art. 2 comma 240 della legge n. 191/2009.

L'accordo, all'art. 5, prevedeva che, per l'attuazione degli interventi, i sottoscrittori si sarebbero avvalsi di uno o più Commissari.

Il Presidente del Consiglio pro-tempore, su proposta del Ministro dell'Ambiente, sentito il Presidente della Regione Basilicata, ha provveduto a nominare, con DPCM in data 21 gennaio 2011 (allegato n.2), il sottoscritto, ing. Francesco Saverio ACITO, "Commissario straordinario delegato alla attuazione degli interventi di cui all'allegato A dell'AdP della Regione Basilicata".

La Giunta Regionale di Basilicata, dal canto suo, con la deliberazione 12.07.2011 n.1013 ha, tra l'altro:

a) preso atto dell'Accordo stipulato in data 14.12.2010;

b) preso atto della nomina del Commissario Straordinario effettuato con DPCM 21.01.2011;

c) deliberato di ammettere a finanziamento i 33 interventi che l'Accordo pone a carico della Regione Basilicata inserendoli sulla Linea di intervento VII.4.1.B del PO FESR Basilicata 2007/2013;

d) deliberato di fornire al Commissario supporto logistico con relativi servizi e materiali di consumo oltreché di unità di proprio personale per il tempo necessario alle effettive necessità, previa intesa con i Dirigenti dei Dipartimenti interessati.

Con deliberazione 22.12.2011, n.1943 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, stabilito:

a) che la Regione Basilicata funge da beneficiario di tutte le operazioni finanziate con il PO FESR Basilicata 2007/2013;

b) che il Commissario Straordinario ed il Responsabile della Linea di Intervento dovranno assicurare, ciascuno per le proprie competenze, la gestione, il controllo, la sorveglianza, il monitoraggio, la rendicontazione e la pubblicità delle operazioni nel rispetto delle disposizioni regolamentare comunitarie;

c) di autorizzare l'Ufficio Difesa del suolo alla predisposizione degli atti per la approvazione dei quadri economici e della pista di controllo ed impegnare e disporre la liquidazione del contributo sulla contabilità speciale n.5594 aperta in favore del Commissario Straordinario presso la Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Potenza, nel rispetto delle disposizioni e secondo la tempistica degli articoli 22 e 20 della Direttiva OO.PP. (D.G.R. n.759/2011).

Successivamente alla sottoscrizione dell'Atto integrativo intervenuto il 14.06.2011 la Giunta regionale con deliberazione n. 637 in data 22.05.2012 ha altresì:

a) preso atto dei 21 nuovi interventi;

b) ha confermato la nomina del Commissario quale soggetto attuatore degli interventi;

c) ha confermato la garanzia del supporto al Commissario.

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 121 del 25.05.2012 della delibera CIPE n.8 del 20.01.2012, la Giunta Regionale di Basilicata, con provvedimento del 4.07.2012 n.860, ha deliberato, tra l'altro:

a) di individuare il Commissario Straordinario Delegato di cui al DPCM 21.01.2011 quale "soggetto attuatore" degli interventi previsti dalla delibere CIPE n. 8/2012;

b) ha demandato allo stesso Commissario l'attività di progettazione e di individuazione del contraente.

2. ATTIVITA' SVOLTA DAL COMMISSARIO AL 31 DICEMBRE 2013

L'art. 2 del DPCM 21.01.2011 di nomina, ha definito puntualmente i compiti del Commissario:

- ***attuare*** gli interventi,
- ***provvedere*** alla opportune azioni di indirizzo e di supporto, promuovendo le occorrenti intese tra soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso,
- ***emanare*** gli atti e i provvedimenti
- ***curare*** tutte le attività di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazioni degli interventi.

Al Commissario sono state attestate, quindi, competenze *esclusivamente* di **attuazione** con **esclusione** delle attività di **programmazione**.

L'art. 4 del decreto di nomina ha individuato, poi, le possibili collaborazioni ed anche i limiti dei protagonismi:… "*Per l'espletamento di tutte le attività tecnico amministrative connesse alla realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario delegato è autorizzato ad avvalersi degli uffici del Ministero dell'Ambiente … delle strutture e degli uffici delle amministrazioni periferiche dello Stato, delle Amministrazione regionale, delle provincie e dei comuni, degli enti locali anche territoriali, dei consorzi, delle università, delle aziende pubbliche di servizi. Le spese relative a tali attività saranno ricomprese nell'ambito dei corrispettivi ed incentivi per la progettazione di cui al comma 5 dell'art. 92 del D. Lgs. N. 163 del 2006"* …

In considerazione di quanto prescritto dal richiamato art. 4 si è provveduto, inizialmente, ad avviare le fasi propedeutiche a quella attuativa, individuando rapidamente i RUP (Responsabile Unici dei Procedimenti), dei singoli interventi inseriti nell'allegato 1 - elenco A dell'A.d.P., esclusivamente tra i dirigenti degli uffici tecnici comunali, o tra i tecnici regionali.

Si è poi verificata anche la possibilità di dare diretta attuazione alle fasi successive, quelle di progettazione e di direzione dei lavori, impegnando, inizialmente, esclusivamente le strutture pubbliche disponibili, ma riscontrando gravi difficoltà per la cronica carenza, "in organico", in molte strutture comunali, di personale tecnico, in particolare ingegneri, strutturisti e geologi, indispensabili per le varie progettazioni.

Doverosamente, sono stati avviati, a tal fine, incontri e confronti con i responsabili politici ed amministrativi della Regione Basilicata e dei Comuni interessati dagli interventi.

E' stata riscontrata una incoraggiante immediata disponibilità per le più ampie forme di collaborazione: da quelle logistiche, alla fornitura di strumenti e mezzi ed alla messa a disposizione di qualificato personale tecnico ed amministrativo, in particolare da parte della Regione Basilicata.

Sono stati anche interessati, per possibili attività di collaborazione, il Provveditorato alle OO.PP. e la Soprintendenza regionale al paesaggio, oltre che la Presidenza del Dipartimento di Ingegneria della Università di Basilicata.

E' stata richiesta la collaborazione del Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto che ha messo a disposizione del Commissario un proprio tecnico per due giorni alla settimana e della società di ricerca Agrobios S.p.A. , Società a totale capitale regionale, che ha messo a disposizione propri ricercatori per eventuali collaborazioni su singoli progetti. E' stata anche coinvolta l'Autorità di Bacino della Basilicata che ha messo a disposizione un Geologo per un giorno alla settimana e altri professionisti per eventuali collaborazioni a progetto.

Con il Provveditorato alle OO.PP. di Puglia e Basilicata è stato sottoscritto, in data 20 giugno 2012, un protocollo per la gestione di 6 interventi dell'Atto Integrativo all'Accordo.

Con la disponibilità di Amministratori e tecnici dei vari comuni interessati e con dirigenti e funzionari della Regione Basilicata, si è provveduto, come già detto, ad individuare i RUP ed i soggetti realizzatori degli interventi. A seguito di successivi aggiustamenti e modifiche risultano i seguenti:

Tabella 1 – Elenco interventi / Soggetti realizzatori / RUP

Codice	Comune	Località	Titolo Intervento	Ente realizzatore	RUP
MT001B/10	Accettura	Fosso delle Conche - Zona le Piagge	Lavori di sistemazione e consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ002A/10	Acerenza	Area urbana e limitrofe	Consolidamento e difesa ambientale - 1° Stralcio - zona a Valle Glinni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ003B/10	Albano di Lucania	Strade Provinciali Sp. 13 e Sp 16	Interventi di consolidamento lungo la SP. 13 e SP. 16	Ufficio tecnico Comune di Albano	Arch. Vito Stoppelli
MT004B/10	Aliano	Loc. Sant'Angelo	Monitoraggio dell'area a rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Aliano	Geom. Domenico Claps
PZ005B/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle della Chiesa del Carmelo-Pisciarelli	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ006A/10	Avigliano	Centro abitato	Sistemazione idrogeologica zona a valle Villa Comunale-Viale della Vittoria	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ007A/10	Avigliano	Loc. Spinamara	Consolidamento loc. Spinamara	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ008A/10	Baragiano	Zona del versante comunale	Intervento di messa in sicurezza di alcuni versanti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ009A/10	Bella	Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Lavori di consolidamento del Versante Est -Plesso Scolastico Via Gandhi	Ufficio Tecnico del Comune di Bella	Geom. Donato Gamma
MT010A/10	Bernalda	Bacino del Fiume Basento - Località Mezzana in Agro di Bernalda	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
MT011B/10	Bernalda	Fosso Zingari	Lavori di sistemazione e consolidamento muro di sostegno	Area Programma Bradanica medio Basento	Dott. For. Giovanni Fiorentini
MT012A/10	Bernalda - Pisticci	Bacino del Fiume Basento	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ013B/10	Brienza	Centro abitato - Zona Spineto	Consolidamento area a monte abitato zona Spineto	Ufficio Tecnico del Comune di Brienza	Arch. Giuseppe Michele Palladino
MT014B/10	Calciano	Località Laghi Parata - Località Cicchione	Lavori di ripristino delle c ondizioni di stabilità del versante	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone

PZ015B/10	Calvello	Fosso Varcaturo	Sistemazione idrogeologica Fosso Varcaturo	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ016B/10	Calvera	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ017B/10	Campomaggiore	Centro abitato	Lavori di consolidamento versanti lungo la strada comunale Campomaggiore-Campomaggiore Vecchio	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ018B/10	Carbone	Centro abitato	Lavori di consolidamento centro abitato	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ019B/10	Castelmezzano	Località Paschiere, Mirutto e Castello	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ020A/10	Castelmezzano	Zona a valle strada comunale Cimitero e SP3	Opere di contenimento e mitigazione del rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ021B/10	Chiaromonte	Centro abitato	Lavori di consolidamento in località Dietro le Mura-Scorciaturo	Ufficio Tecnico del Comune di Chiaromonte	Ing. Giovanni Pangaro
MT022B/10	Cirigliano	Valle Piano	Intervento di messa in sicurezza area interessata da caduta massi	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ023A/10	Gallicchio	Centro storico - Via Roma	Consolidamento e sistemazione idraulico forestale	Ufficio tecnico Comune di Gallicchio	Dr. Rocco Balzano
MT024B/10	Garaguso	Contrada Pantoni	Intervento di riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico Comune di Garaguso	Ing. Angela Lisanti
PZ025A/10	Genzano di Lucania	Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Sistemazione idraulica del Torrente Basentello e suoi affluenti in sinistra idraulica a monte della S.S. 655 Bradanica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ026B/10	Genzano di Lucania	Gaudemanno	Sistemazione fosso Gaudemanno	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT027B/10	Gorgoglione	Piazza Zanardelli	Intervento di messa in sicurezza area interessata da dissesto idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Geom. Donato Vincenzo Gagliardi
MT028B/10	Grassano	Via Tilea - Strettolone	Lavori di consolidamento del versante - area impianti sportivi	Ufficio tecnico Comune di Grassano	Arch.Pasquale Deniso
MT029A/10	Grottole	Centro abitato e aree limitrofe	Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico del Comune di Grottole	Ufficio tecnico Comune di Grottole	Ing. Rocco Vitella
MT030A/10	Irsina		Ripristino strada comunale denominata "Fosso Martelli" - 1° stralcio	Ufficio Tecnico Comune di Irsina	Ing. Giuseppe Dicandia

PZ031C/10	Latronico	Latronico foglio 211 III° N.O.	Consolidamento zona N.O. Latronico centro - Fabbricato pericolante via Montegrappa	Ufficio Tecnico Comune di Latronico	Ing. Prosperino Suanno
PZ032B/10	Lauria	Lauria Inferiore	Lavori di messa in sicurezza in Vico IV Cerruto-Piede Costone Armo	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ033A/10	Lauria	Seta -Gremile	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico Comune di Lauria	Ing. Biagio Papaleo
PZ034B/10	Lavello	Centro abitato	Lavori di completamento consolidamento Rione Casale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ035A/10	Maschito	Centro abitato e frazioni	Consolidamento e difesa ambientale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT036A/10	Matera	Rione Sassi	Rione Sassi. Lavori di disgaggio di blocchi di roccia in equilibrio precario lungo le pareti rocciose prospicienti le aree "Madonna dell'Idris, vico Solitario e via Madonna delle Virtù".	Ufficio Tecnico Comune di Matera	Arch. Giuseppe Gandi
PZ037A/10	Melfi	Versante a monte SS.401 Dir Km. 13+100-Km. 13+400	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Melfi	Ing. Gerardo Calvello
MT038B/10	Miglionico	Via Trinità	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ039A/10	Missanello	Fosso Creta	Lavori di sistemazione idraulica e risagomatura alveo	Ufficio Tecnico del Comune di Missanello	Geom. Domenico La Vecchia
PZ040A/10	Moliterno	Sp ex SS 103 Km. 8+400-8+500	Consolidamento frana e ripristino sede stradale	Chiesto devoluzione su altro intervento per finanziamento dell'opera con altre risorse	
MT041A/10	Montalbano Jonico	Coordinate: 40°17' 36 N 16°23' 38 E	Messa in sicurezza dal rischio idraulico delle aree del centro storico del comune di Montalbano Jonico Area adiacente al centro urbano compresa tra piazza Cirillo e via Caracciolo	Ufficio Tecnico del Comune di Montalbano	Ing.Michelina Larocca
PZ042B/10	Montemurro	Fosso Libritti	Completamento lavori difesa del suolo Fosso Libritti	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ043A/10	Muro Lucano	Rione San Nicola	Lavori di consolidamento e recupero urbanistico del Rione San Nicola nel centro storico di Muro Lucano	Ufficio Tecnico del Comune di Muro Lucano	Arch. Francesco Cristiano
PZ044B/10	Nemoli	Vallone	Sistemazione idraulica	Ufficio Tecnico del Comune di Nemoli	Ing. Nicola Anania
MT045A/10	Nova Siri	Centro Storico	eliminazione condizioni di rischio idrogeologico nel centro storico	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone

MT046A/10	Oliveto Lucano	"Rupe - Vallone di Mezzo"	Mitigazione rischio idrogeologico (proposta ministeriale)	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Pietro Perrone
PZ047B/10	Oppido Lucano	Centro abitato	Lavori di consolidamento in loc. Annunziata-Santa Lucia - Terzillo	Ufficio Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ048A/10	Oppido Lucano	Centro abitato e zone limitrofe	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Oppido	Ing. Donato Michele Ramunno
PZ049A/10	Palazzo San Gervasio	Torrente Ginestrello	Lavori di ripristino dell'officiosità	Ufficio Tecnico Comune di Palazzo san Gervasio	Ing. Antonio Clinco
PZ050A/10	Picerno	Centro abitato	Lavori di consolidamento del centro abitato nelle località Via Convento e Montagna (Torrente Braide)	Ufficio Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ051A/10	Picerno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Picerno	Ing. Leonardo Zaccagnino
PZ052A/10	Pignola	Piatamone	Lavori di consolidamento a valle della S.P.5	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT053A/10	Pomarico	Fosso Bordazzo e zone limitrofe	Intervento di messa in sicurezza, consolidamento e sistemazione idrogeologica del Fosso Bordazzo	Ufficio Tecnico del Comune di Pomarico	Arch. Giacomo Pignatelli
PZ054B/10	Potenza	S. Luca Branca	Lavori di sistemazione idrogeologica versante a valle della strada comunale	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ055A/10	Potenza	Costa della Gaveta	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Potenza	Ing. Giuseppe Lisi
PZ056B/10	Rapolla	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica fosso in dx idraulica torrente Melfia	Ufficio Tecnico del Comune di Rapolla	Geom. Eduardo Di Franco
PZ057B/10	Rionero in Vulture	Centro abitato	Lavori di sistemazione idrogeologica Fosso Ciaolino	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ058A/10	Ripacandida	Centro abitato	Lavori di consolidamento loc. San Pietro	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ059A/10	Rivello	Cammartino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT060A/10	Rotondella	Coordinate: 40°10' 19 N 16°31 '22 E	Consolidamento e messa in sicurezza del tratto di strada di via Aspromonte sottostante corso Garibaldi del centro abitato.	Ufficio Tecnico del Comune di Rotondella	Ing. Nicola Castronuovo
PZ061B/10	San Costantino Albanese	Centro abitato	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

PZ062A/10	San Fele	Rione Pergola/Nocicchio	Intervento di consolidamento e sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ063A/10	San Martino d'Agri	Centro abitato - Località San Giovanni - area adiacente Chiesa Santa Maria della Rupe	Completamento consolidamento loc. San Giovanni	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT064A/10	San Mauro Forte	Zona Campo Sportivo - Vico A. Diaz	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico zona "campo Sportivo vico Diaz	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
MT065A/10	San Mauro Forte	Località Garamme	Lavori di riassetto territoriale a rischio idrogeologico "località Garamme" - 1° Stralcio.	Ufficio Tecnico del Comune di San Mauro Forte	Geom. Egidio Cerabona
PZ066A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Costone in località Pescara	Intervento urgente per lavori di sistemazione, messa in sicurezza e risanamento del costone in località Pescara	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ067A/10	Sant'Angelo Le Fratte	Coste-Cupa-Piazza dei Martiri	Consolidamento blocchi rocciosi in zona cupa	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Angelo Le Fratte	Ing. Leonardo Calbi
PZ068A/10	Sant'Arcangelo	Rione Mauro	Completamento Lavori di mitigazione del rischio idrogeologico in Rione Mauro	Ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo	Geom. Domenico Claps
PZ069A/10	Sarconi	Versante nord-est abitato - a valle della Chiesa Madre	Mitigazione rischio idrogeologico	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ070B/10	Sasso di Castalda	Calvario-Serrone	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ071B/10	Satriano di Lucania	Rione S. Martino	Lavori di consolidamento	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT072B/10	Stigliano	Rione Casale e Sant'Antonio	Lavori urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Stigliano	Ing. Salvatore D'Ambrosio
PZ073A/10	Terranova di Pollino	Loc. Carolanza	Regimazione acque superficiali	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ074A/10	Tito	Via Gramsci-Via Roma	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ075A/10	Tolve	Selce	Lavori di rischio idrogeologico in Loc. Selce	Ufficio Tecnico del Comune di Tolve	Arch. Giuseppe Lo Tito
PZ076C/10	Trecchina	Zillona-SS.585	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ077A/10	Trecchina	SS.585 km 9+600	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte SS.585 all'altezza del km 9+600	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello

MT078A/10	Tricarico	Fiume Basento-Serre del Ponte-Isola Amm.va di Tricarico	Lavori di sistemazione idrogeologica del versante in sx idraulica	Ufficio Difesa del suolo di Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT079A/10	Tricarico	Strada Comunale Alvanello-San Marco	Lavori di consolidamento strada Comunale Alvanello S. Marco	Ufficio Programma Regione Basilicata	Arch. Enzo Paolo Petruzzi
PZ080A/10	Trivigno	Centro abitato	Riduzione rischio idrogeologico	Ufficio Tecnico del Comune di Trivigno	Ing. Vito Ramunno
MT081A/10	Tursi	Rione Rabatana	Consolidamento e messa in sicurezza versante via Duca degli Abruzzi – Rione Rabatana	Ufficio Tecnico del Comune di Tursi	Dott. Giuseppe Veneziano
MT082A/10	Valsinni	Coordinate: 40°10'07 N 16°26'35 E	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico nel centro abitato: intervento di consolidamento e messa in sicurezza della parete sovrastante e sottostante Piazza Melidoro	Ufficio Tecnico Comune di Valsinni	Ing. Francesco Tagliente
PZ083A/10	Venosa	Vallone Reale Vallone Ruscello	Risanamento e sistemazione idraulica a salvaguardia del centro storico	Ufficio Tecnico del Comune di Venosa	Arch. Elisabetta Pescuma
PZ084A/10	Viggianello	Località Gallizzi	Consolidamento versante a monte e a valle strada comunale	Ufficio Tecnico del Comune di Viggianello	Ing. Nicola Bencardino
MT085A/10	Bernalda	Spiaggia lido di Metaponto	Interventi di mitigazione del fenomeno di erosione costiera del metapontino	Ufficio Difesa del suolo di Matera	Ing. Antonio Losinno
PZ0086A/11	Castelluccio Inferiore	Contrada Amoroso	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0087A/11	Grassano	Fosso Mulini - Golfo (loc. Golfi)	Lavori di completamento della sistemazione del fosso Mulini-Golfo	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
MT0088A/11	Miglionico	Sotto le Vigne - Via Marconia	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di regimentazione idraulica del versante.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Giuseppe Brandi
MT0089A/11	Nova Siri	Torrente Toccacielo	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0090A/11	Pignola	Contrada Campo di Giorgio	Lavori di consolidamento in C.da Campo di Giorgio	Ufficio Tecnico del Comune di Tito	Ing. Donato Rosa
MT0091A/11	Bacino del Fiume Agri	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Pulizia, eliminazione di vegetazione in alveo, eliminazione di materiale alluvionale e ripristino arginature	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
PZ0092A/11	Chiaromonte	Valle dei Pastori	Lavori di sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello

MT0093A/11	Colobraro	Centro Abitato	Intervento urgente di consolidamento e messa in sicurezza dell'area Centro Abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivolella
PZ0094A/11	Maratea	SS.18 intero tratto regionale	Lavori di messa in sicurezza costone roccioso a monte e a valle della S.S. 18	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
PZ0095A/11	Melfi	Contrada Isca della Ricotta	Lavori di sistemazione idraulica Fiumara Ofanto	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0096A/11	Montalbano Jonico	Via Sant'Antuono	Eliminazione condizioni di rischio	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Clara Giordano
MT0097A/11	Pisticci	Versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Lavori di mitigazione rischio idrogeologico: intervento di consolidamento e regimentazione idraulica del versante di Fosso La Salsa e Fosso Concezione	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Salvatore Giannace
PZ0098A/11	Rapone	Mazzapone	Lavori di sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Potenza	Ing. Gerardo Calvello
MT0099A/11	Salandra	Centro abitato - Zona Calvario	Consolidamento del centro abitato di Salandra - Zona Calvario	Ufficio Tecnico Comune di Salandra	Ing. Domenico Terranova
MT0100A/11	San Giorgio Lucano	Centro abitato - zona Timpa	Lavori di riduzione del rischio idrogeologico esistente nell'abitato del comune di S.Giorgio Lucano; zona Timpa.	Provveditorato OO.PP.	Ing. Mario Martorano
PZ0101A/11	Tito	Zona a valle di Via Settentrionale	Consolidamento dell'abitato di Tito del Capoluogo	Comune di Tito	Ing. Leonardo Calbi
PZ0102A/11	Vaglio	Cannitelli	Lavori di Ripristino officiosità	Provveditorato OO.PP.	Ing. Gennaro De Meo
PZ0103A/11	Vaglio	Via Ciro Menotti, Vico Diaz - Valle di Via Isonzo - Villa Comunale nel rione Paschiere	Consolidamento abitato e risanamento dissesto idrogeologico dell'abitato	Provveditorato OO.PP.	Ing. Vito Sivolella
MT0104A/11	Provincia di Matera	Bacino del Fiume Bradano	Lavori di ripristino officiosità idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0105A/11	Ferrandina, Salandra, Calciano	SS. 407 basentana	Sistemazione idrogeologica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello
MT0106A/11	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	F.so Mortella; Confluenze Torrente Pescogrosso; F. Sinni-attraversamento ss106.	Lavori di ripristino officiosità e sistemazione idraulica	Ufficio Difesa del Suolo Matera	Ing. Gerardo Calvello

In verde gli interventi a cura dei Comuni; in azzurro quelli a cura degli Uffici regionali; in rosso l'intervento già finanziato con altre risorse e per il quale è stata avanzata proposta di devoluzione al progetto COD MT078A/10; in giallo gli interventi a cura del Provveditorato interregionale alle OO.PP.

Con il procedere delle attività e l'accumularsi delle incombenze connesse con la attuazione degli interventi, si sempre più evidenziata tutta la insufficienza organica della struttura del Commissario operante in una condizione di "dipendenza" dalle disponibilità di soggetti pubblici terzi. Il ricorso a incarichi di consulenza esterne previsti dal DPCM 20 luglio 2011 – art.1 comma 5 avrebbe potuto garantire migliori e più tempestivi risultati.

Ancora ora, l'Ufficio del Commissario opera con le seguenti, *preziose e qualificate,* collaborazioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa con le strutture di appartenenza:

-una unità tecnica, a tempo parziale (2 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto di Matera, impegnata per rilievi, disegni, gestione informatica dei dati;

-un geologo, per un giorno alla settimana posto a disposizione dall'Autorità di Bacino della Basilicata, impegnato per seguire sotto l'aspetto geologico-tecnico, gli interventi più "delicati";

-una unità tecnica, a tempo parziale (3 giorni alla settimana), posta a disposizione dal Dipartimento Attività Produttive Politiche dell'Impresa Innovazione Tecnologica della Regione Basilicata, che tutt'ora regge il gran peso di tutta la attività tecnica ed amministrativa;

-con le Direzioni Generali della Presidenza della Giunta Regionale e del Dipartimento regionale alle Infrastrutture sono attive *collaborazioni a progetto* e per la gestione del sito ufficiale del Commissario;

-continua e costante è, poi, la collaborazione, dell'Ufficio Ragioneria Generale e Fiscalità Regionale della Regione Basilicata per la gestione dei rapporti con la tesoreria provinciale della Banca d'Italia, presso la quale è acceso il conto, in contabilità speciale, del Commissario e per le attività di rendicontazione;

-una unità tecnica, per un giorno alla settimana, posta a disposizione dal Comune di Missanello, impegnata per attività di verifica progetti e dati;

-con il personale degli uffici del Dipartimento regionale Ambiente e Territorio sono attive *collaborazioni a progetto* anche in orari eccedenti quello ordinario.

Ad oggi ***non è stata*** quindi ***attivata alcuna collaborazione "esterna"*** agli Enti pubblici o Enti e Società a capitale pubblico.

Pur nella limitata, numericamente, disponibilità di personale di supporto e soprattutto i ritardi nel trasferimento alla Contabilità speciale del Commissario delle somme programmate, l'attività del Commissario non ha subito soste ed allo stato è possibile certificare i dati di cui alle tabelle che seguono.

3. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PRODOTTA

Gli atti formali prodotti dal Commissario dal 21.01.2011 al 31 dicembre 2013 risultano i seguenti:

- **Ordinanze** n.16
- **Decreti** n. 824
- **Autorizzazioni ad attività propedeutiche** n. 121
- **Protocolli** in entrata ed uscita: circa 13.000.

Con i succitati atti risultano, tra l'altro, sviluppate le seguenti attività e provvedimenti, al 31 dicembre 2013:

1. **progetti approvati: n. 104** per complessivi **€. 33.904.000,00** dei quali:

1.1. - n. 30 + 2 (cofinanziati fondo FESR) per €. 6.735.000,00 sui fondi PO FESR Basilicata 2007-2013;

1.2. - n. 9 + 1 (cofinanziato MATTM) per €. 4.520.703,60 sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 o fondi del piano sud;

1.3. - n. 60 + 1 (cofinanziato CIPE) per €. 22.998.296,40 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

Come da Tabella n. 1 seguente

Tabella n. 2 – Progetti approvati al 31/12/2013

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Decreto di approvazione		Codice Finanziamento	Comune	Importo intervento
			Numero	data			
1	MT001B/10		153/2013	21/05/2013	B	Accettura	€ 200.000,00
2	PZ002A/10	BASFV56	114/2013	22/04/2013	Cipe	Acerenza	€ 200.000,00
3	PZ003B/10		219/2012	18/12/2012	B	Albano di Lucania	€ 180.000,00
4	MT004B/10		37/2012	13/04/2012	B	Aliano	€ 60.000,00
5	PZ005B/10		203/2012	10/12/2012	B	Avigliano	€ 200.000,00
6	PZ006A/10	BASFV57	517/2013	28/11/2013	Cipe	Avigliano	€ 300.000,00
7	PZ007A/10	BASFV26	345/2013	03/09/2013	Cipe	Avigliano	€ 500.000,00
8	PZ008A/10	BASFV58	91/2013	04/04/2013	Cipe	Baragiano	€ 300.000,00
9	PZ009A/10	BASFV58	96/2013	09/04/2013	Cipe	Bella	€ 300.000,00
10	MT010A/10	BASFV02	1/2012	05/01/2012	A	Bernalda	€ 100.000,00
11	MT011B/10		131/2013	04/05/2013	B	Bernalda	€ 190.000,00
12	MT012A/10	BASFV03	12/2012	21/02/2012	A	Bernalda - Pisticci	€ 500.000,00
13	PZ013B/10		110/2013	16/04/2013	B	Brienza	€ 200.000,00

14	MT014B/10		76/2012	22/06/2012	B	Calciano	€ 190.000,00
15	PZ015B/10		14/2012	23/02/2012	B	Calvello	€ 190.000,00
16	PZ016B/10		445/2013	25/10/2013	B	Calvera	€ 330.000,00
17	PZ017B/10		35/2012	13/04/2012	B	Campomaggiore	€ 80.000,00
18	PZ018B/10		10/2013	23/01/2013	B	Carbone	€ 215.000,00
19	PZ019B/10		229/2013	01/07/2013	B	Castelmezzano	€ 100.000,00
20	PZ020A/10	BASFV27	353/2013	05/09/2013	Cipe	Castelmezzano	€ 150.000,00
21	PZ021B/10		106/2013	15/04/2013	B	Chiaromonte	€ 220.000,00
22	MT022B/10		15/2012	23/02/2012	B	Cirigliano	€ 190.000,00
23	PZ023A/10	BASFV60	176/2013	31/05/2013	Cipe	Gallicchio	€ 300.000,00
24	MT024B/10		71/2012	14/06/2012	B	Garaguso	€ 190.000,00
25	PZ025A/10	BASFV18	495/2013	20/11/2013	Cipe	Genzano di Lucania	€ 300.000,00
26	PZ026B/10		36/2012	13/04/2012	B	Genzano di Lucania	€ 140.000,00
27	MT027B/10		466/2013	05/11/2013	B	Gorgoglione	€ 190.000,00
28	MT028B/10		516/2013	28/11/2013	B	Grassano	€ 185.000,00
29	MT029A/10	BASFV28	107/2013	16/04/2013	Cipe	Grottole	€ 250.000,00
30	MT030A/10		216/2012	01/12/2012	A	Irsina	€ 31.703,60
		BASFV13	216/2012	01/12/2012	Cipe	Irsina	€ 168.296,40
31	PZ031C/10	BASFV17	170/2012	12/11/2012	Cipe	Latronico	€ 170.000,00
					B		€ 330.000,00
32	PZ032B/10		45/2012	30/04/2012	B	Lauria	€ 330.000,00
33	PZ033A/10	BASFV29	152/2012	19/10/2012	Cipe	Lauria	€ 450.000,00
34	PZ034B/10		181/2013	04/06/2013	B	Lavello	€ 330.000,00
35	PZ035A/10	BASFV62	195/2013	12/06/2013	Cipe	Maschito	€ 400.000,00
36	MT036A/10	BASFV04	220/2012	31/12/2012	A	Matera	€ 450.000,00
37	PZ037A/10	BASFV20	573/2013	09/12/2013	Cipe	Melfi	€ 400.000,00
38	MT038B/10		212/2013	20/06/2013	B	Miglionico	€ 80.000,00
39	PZ039A/10	BASFV61	75/2012	22/06/2012	Cipe	Missanello	€ 270.000,00
40	MT041A/10	BASFV63	159/2013	22/05/2013	Cipe	Montalbano Jonico	€ 350.000,00
41	PZ042B/10		53/2012	15/05/2012	B	Montemurro	€ 180.000,00
42	PZ043A/10	BASFV64	436/2013	21/10/2013	Cipe	Muro Lucano	€ 300.000,00
43	PZ044B/10		73/2012	20/06/2012	B	Nemoli	€ 130.000,00
44	MT046A/10	BASFV30	372/2013	13/09/2013	Cipe	Oliveto Lucano	€ 400.000,00
45	PZ047B/10		366/2013	11/09/2013	B	Oppido Lucano	€ 200.000,00
46	PZ048A/10	BASFV66	369/2013	12/09/2013	Cipe	Oppido Lucano	€ 200.000,00
47	PZ049A/10	BASFV21	158/2013	22/05/2013	Cipe	Palazzo San Gervasio	€ 100.000,00
48	PZ050A/10	BASFV31	180/2013	04/06/2013	Cipe	Picerno	€ 250.000,00
49	PZ051A/10	BASFV32	113/2013	19/04/2013	Cipe	Picerno	€ 400.000,00
50	PZ052A/10	BASFV33	356/2013	09/09/2013	Cipe	Pignola	€ 350.000,00

51	MT053A/10	BASFV08	80/2012	29/06/2012	A	Pomarico	€ 200.000,00
52	PZ054B/10		31/2012	05/04/2012	B	Potenza	€ 190.000,00
53	PZ055A/10	BASFV34	263/2013	18/07/2013	Cipe	Potenza	€ 450.000,00
54	PZ056B/10		88/2013	03/04/2013	B	Rapolla	€ 200.000,00
55	PZ057B/10		577/2013	14/12/2013	B	Rionero in Vulture	€ 340.000,00
56	PZ058A/10	BASFV67	207/2013	20/06/2013	Cipe	Ripacandida	€ 200.000,00
57	PZ059A/10	BASFV68	213/2013	21/06/2013	Cipe	Rivello	€ 350.000,00
58	MT060A/10	BASFV35	327/2013	23/08/2013	Cipe	Rotondella	€ 200.000,00
59	PZ061B/10		85/2013	29/03/2013	B	S. Costantino Albanese	€ 200.000,00
60	PZ062A/10	BASFV36	157/2012	23/10/2012	Cipe	San Fele	€ 350.000,00
61	PZ063A/10	BASFV69	137/2012	27/09/2012	Cipe	San Martino d'Agri	€ 300.000,00
62	MT064A/10	BASFV37	65/2013	18/03/2013	Cipe	San Mauro Forte	€ 400.000,00
63	MT065A/10	BASFV38	92/2013	05/04/2013	Cipe	San Mauro Forte	€ 400.000,00
64	PZ066A/10	BASFV39	558/2013	11/12/2013	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	€ 450.000,00
			580/2013	16/12/2013			€ 150.000,00
65	PZ067A/10	BASFV19	146/2013	15/05/2013	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	€ 100.000,00
66	PZ068A/10	BASFV70	66/2013	18/03/2013	Cipe	Sant'Arcangelo	€ 200.000,00
67	PZ069A/10	BASFV71	80/2013	28/03/2013	Cipe	Sarconi	€ 200.000,00
68	PZ070B/10		17/2013	30/01/2013	B	Sasso di Castalda	€ 200.000,00
69	PZ071B/10		131/2012	24/09/2012	B	Satriano di Lucania	€ 220.000,00
70	MT072B/10		16/2012	24/02/2012	B	Stigliano	€ 255.000,00
71	PZ073A/10	BASFV72	591/2013	24/12/2013	Cipe	Terranova di Pollino	€ 100.000,00
72	PZ074A/10	BASFV40	81/2012	30/06/2012	Cipe	Tito	€ 400.000,00
73	PZ075A/10	BASFV41	228/2013	28/06/2013	Cipe	Tolve	€ 350.000,00
74	PZ076C/10	BASFV14	136/2012	27/09/2012	Cipe	Trecchina	€ 200.000,00
					B		€ 300.000,00
75	PZ077A/10	BASFV25	21/2012	07/03/2012	Cipe	Trecchina	€ 80.000,00
76	MT078A/10	BASFV01	1/2011	13/07/2011	A	Tricarico	€ 800.000,00
			151/2012	12/10/2012			
77	MT079A/10	BASFV16	161/2013	22/05/2013	Cipe	Tricarico	€ 380.000,00
78	PZ080A/10	BASFV74	216/2013	21/06/2013	Cipe	Trivigno	€ 400.000,00
79	MT081A/10	BASFV05	22/2013	07/02/2013	A	Tursi	€ 700.000,00
80	MT082A/10	BASFV74	101/2013	12/04/2013	Cipe	Valsinni	€ 400.000,00
81	PZ083A/10	BASFV42	250/2013	13/07/2013	Cipe	Venosa	€ 350.000,00
82	PZ084A/10	BASFV43	139/2013	10/05/2013	Cipe	Viggianello	€ 250.000,00
83	MT085A/10	BASFV07	260/2013	18/07/2013	A	Bernalda - Metaponto	€ 300.000,00
		BASFV15			Cipe		€ 2.700.000,00
84	PZ086A/11	BASFV75	502/2013	22/11/2013	Cipe	Castelluccio Inferiore	€ 1.373.000,00
			515/2013	28/11/2013			€ 627.000,00

85	MT087A/11	BASFV44	141/2013	10/05/2013	Cipe	Grassano	€ 400.000,00
86	MT088A/11	BASFV45	147/2013	16/05/2013	Cipe	Miglionico	€ 200.000,00
87	MT089A/11	BASFV06	192/2013	11/06/2013	A	Nova Siri	€ 200.000,00
88	PZ090A/11	BASFV46	462/2013	04/11/2013	Cipe	Pignola	€ 150.000,00
89	MT091A/11	BASFV09	143/2012	04/10/2012	A	Bacino del fiume Agri	€ 500.000,00
90	PZ092A/11	BASFV24	486/2013	14/11/2013	Cipe	Chiaromonte	€ 150.000,00
91	MT093A/11	BASFV47	322/2013	22/08/2013	Cipe	Colobraro	€ 500.000,00
92	PZ094A/11	BASFV48	227/2013	28/06/2013	Cipe	Maratea	€ 700.000,00
93	PZ095A/11	BASFV22	494/2013	20/11/2013	Cipe	Melfi	€ 500.000,00
94	MT096A/11	BASFV49	471/2013	06/11/2013	Cipe	Montalbano Jonico	€ 200.000,00
95	MT097A/11	BASFV50	572/2013	13/12/2013	Cipe	Pisticci	€ 150.000,00
96	PZ098A/11	BASFV51	581/2013	16/12/2013	Cipe	Rapone	€ 180.000,00
97	MT099A/11	BASFV52	79/2013	28/03/2013	Cipe	Salandra	€ 100.000,00
98	MT0100A/11	BASFV53	174/2013	30/05/2013	Cipe	San Giorgio Lucano	€ 400.000,00
99	PZ0101A/11	BASFV54	338/2013	29/08/2013	Cipe	Tito	€ 400.000,00
100	PZ0102A/11	BASFV23	104/2013	15/04/2013	Cipe	Vaglio	€ 300.000,00
101	PZ0103A/11	BASFV55	89/2013	04/04/2013	Cipe	Vaglio	€ 500.000,00
102	MT0104A/11	BASFV10	225/2013	28/06/2013	A	Fiume Bradano	€ 339.000,00
103	MT0105A/11	BASFV11	379/2013	17/09/2013	A	Basentana	€ 200.000,00
104	MT0106A/11	BASFV12	86/2013	02/04/2013	A	Fiume Sinni	€ 200.000,00
						Totale	**€ 34.254.000,00**

finanziamento codice A (MATTM)	**11**	**€ 4.520.703,60**
finanziamento Delibera CIPE	**61**	**€ 22.998.296,40**
finanziamento codice B (FESR)	**32**	**€ 6.735.000,00**
TOTALE	**104**	**€ 34.254.000,00**

1.1 **attività propedeutiche alle progettazioni** su progetti non ancora approvati: n. **3** incarichi per complessivi **€. 11.879,42** sui fondi delibera CIPE n.8/2012

La Tabella n.3 riporta l'elenco dei progetti per i quali le attività propedeutiche sopra indicate sono state avviate e gli importi programmati per gli interventi relativi:

Tabella n. 3 – Progetti attivati escluso gli approvati al 31/12/2013

Numero	Codice Lavoro	Codice CIPE	Codice finanziamento	Comune	Importo Intervento Euro		
					MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT045A/10	BASFV65	Cipe	Nova Siri		500.000,00	
				Totale	**0,00**	**500.000,00**	**0,00**

Tabella n. 4 – Progetti con aggiudicazione definitiva/provvisoria al 31/12/2013

Numero	Codice Lavoro	Codice finanziamento	Comune	Codice CIPE	Aggiudicazione		Importo Intervento Euro		
					tipo	data	MATTM	CIPE	PO-FESR
1	MT001B/10	B	Accettura		definitiva	15/07/2013			200.000
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	BASFV56	definitiva	24/07/2013		200.000	
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania		definitiva	22/02/2013			180.000
4	MT004B/10	B	Aliano		definitiva	15/06/2012			60.000
5	PZ005B/10	B	Avigliano		definitiva	01/03/2013			200.000
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	BASFV57	provvisoria	21/12/2013		300.000	
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	BASFV26	definitiva	02/12/2013		500.000	
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	BASFV58	definitiva	04/06/2013		300.000	
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	BASFV59	definitiva	08/07/2013		300.000	
10	MT010A/10	A	Bernalda	BASFV02	definitiva	17/02/2012	100.000		
11	MT011B/10	B	Bernalda		definitiva	27/08/2013			190.000
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	BASFV03	definitiva	18/05/2012	500.000		
13	PZ013B/10	B	Brienza		definitiva	19/07/2013			200.000
14	MT014B/10	B	Calciano		definitiva	03/09/2012			190.000
15	PZ015B/10	B	Calvello		definitiva	03/07/2012			190.000
16	PZ016B/10	B	Calvera		provvisoria	12/12/2013		330.000	

17	PZ017B/10	B	Campomaggiore		definitiva	31/07/2012			80.000
18	PZ018B/10	B	Carbone		definitiva	12/04/2013			215.000
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano		definitiva	27/08/2013			100.000
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	BASFV27	definitiva	31/10/2013		150.000	
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte		definitiva	03/07/2013			220.000
22	MT022B/10	B	Cirigliano		definitiva	13/07/2012			190.000
23	PZ023A/10	Cipe	Gallicchio	BASFV60	definitiva	03/09/2013		300.000	
24	MT024B/10	B	Garaguso		definitiva	04/09/2012			190.000
25	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania		definitiva	31/07/2012			140.000
26	MT027B/10	B	Gorgoglione		provvisoria	13/12/2013	190.000		
27	MT028B/10	B	Grassano		provvisoria	23/12/2013			
28	MT029A/10	Cipe	Grottole	BASFV28	definitiva	27/08/2013		250.000	
29	MT030A/10	Cipe	Irsina	BASFV13	definitiva	24/06/2013		168.296,40	
		A					31.703		
30	PZ031C/10	Cipe	Latronico	BASFV17	definitiva	03/05/2013		170.000	
		B							330.000
31	PZ032B/10	B	Lauria		definitiva	24/07/2012			330.000
32	PZ033A/10	Cipe	Lauria	BASFV29	definitiva	10/06/2013		450.000	
33	PZ034B/10	B	Lavello		definitiva	03/09/2013			330.000
34	PZ035A/10	Cipe	Maschito	BASFV62	definitiva	03/09/2013		400.000	
35	MT036A/10	A	Matera	BASFV04	definitiva	02/05/2013	450.000		
36	MT038B/10	B	Miglionico		definitiva	04/11/2013			80.000
37	PZ039A/10	Cipe	Missanello	BASFV61	definitiva	19/10/2012		270.000	
38	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV63	definitiva	16/10/2013		350.000	
39	PZ042B/10	B	Montemurro		definitiva	31/07/2012			180.000
40	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	BASFV64	definitiva	01/10/2013		300.000	
41	PZ044B/10	B	Nemoli		definitiva	24/08/2012			130.000
42	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	BASFV30	definitiva	04/12/2013		400.000	
43	PZ047B/10	B	Oppido Lucano		provvisoria	07/12/2013			200.000
44	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	BASFV66	definitiva	12/12/2013		200.000	
45	PZ049A/10	Cipe	Palazzo S.Gervaso	BASFV21	definitiva	21/06/2013		100.000	
46	PZ050A/10	Cipe	Picerno	BASFV31	definitiva	03/09/2013		250.000	
47	PZ051A/10	Cipe	Picerno	BASFV32	definitiva	23/08/2013		400.000	
48	PZ052A/10	Cipe	Pignola	BASFV33	definitiva	20/12/2013		350.000	
49	MT053A/10	A	Pomarico	BASFV08	definitiva	09/10/2012	200.000		
50	PZ054B/10	B	Potenza		definitiva	13/07/2012			190.000
51	PZ055A/10	Cipe	Potenza	BASFV34	provvisoria	18/11/2013		450.000	
52	PZ056B/10	B	Rapolla		definitiva	18/07/2013			200.000
53	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	BASFV67	definitiva	27/08/2013		200.000	

54	PZ059A/10	Cipe	Rivello	BASFV68	definitiva	11/09/2013		350.000	
55	MT060A/10	Cipe	Rotondella	BASFV35	provvisoria	29/11/2013		200.000	
56	PZ061B/10	B	San Costantino Alb.		definitiva	27/05/2013			200.000
57	PZ062A/10	Cipe	San Fele	BASFV36	definitiva	21/01/2013		350.000	
58	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	BASFV69	definitiva	10/12/2012		300.000	
59	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV37	definitiva	26/06/2013		400.000	
60	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	BASFV38	definitiva	30/09/2013		400.000	
61	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV39	provvisoria	28/12/2013		450.000	
62	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	BASFV19	definitiva	10/07/2013		100.000	
63	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	BASFV70	definitiva	11/09/2012		40.457	
					definitiva	03/06/2013		159.543	
64	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	BASFV71	definitiva	04/06/2013		200.000	
65	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda		definitiva	12/04/2013			200.000
66	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania		definitiva	21/01/2013			220.000
67	MT072B/10	B	Stigliano		definitiva	05/07/2012			255.000
68	PZ074A/10	Cipe	Tito	BASFV40	definitiva	27/08/2012		400.000	
69	PZ075A/10	Cipe	Tolve	BASFV41	provvisoria	12/12/2013		350.000	
70	PZ076C/10	B	Trecchina		definitiva	10/12/2012			300.000
		Cipe		BASFV14				200.000	
71	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	BASFV25	definitiva	13/07/2012		80.000	
72	MT078A/10	A	Tricarico	BASFV01	definitiva	13/07/2011	399.000		
					definitiva	20/11/2012	401.000		
73	MT079A/10	Cipe	Tricarico	BASFV16	definitiva	04/12/2013		380.000	
74	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	BASFV73	definitiva	02/09/2013		400.000	
75	MT081A/10	A	Tursi	BASFV05	definitiva	04/01/2013	700.000		
76	MT082A/10	Cipe	Valsinni	BASFV74	definitiva	03/09/2013		400.000	
77	PZ083A/10	Cipe	Venosa	BASFV42	provvisoria	06/12/2013		350.000	
78	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	BASFV43	provvisoria	23/12/2013		250.000	
79	MT085A/10	A	Metaponto	BASFV07	definitiva	18/03/2013	300.000		
		Cipe		BASFV15				2.700.000	
80	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	BASFV75	provvisoria	06/12/2013		1.373.000	
81					provvisoria	06/12/2013		627.000	
82	MT087A/11	Cipe	Grassano	BASFV44	definitiva	18/07/2013		400.000	
83	MT088A/11	Cipe	Miglionico	BASFV45	definitiva	21/08/2013		200.000	
84	MT089A/11	A	Nova Siri	BASFV06	definitiva	18/09/2013	200.000		
85	MT091A/11	A	Agri	BASFV09	definitiva	14/12/2012	500.000		
86	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	BASFV24	provvisoria	20/12/2013		150.000	
87	MT093A/11	Cipe	Colobraro	BASFV47	definitiva	11/11/2013		500.000	
88	PZ094A/11	Cipe	Maratea	BASFV48	definitiva	03/09/2013		700.000	

89	PZ095A/11	Cipe	Melfi	BASFV22	provvisoria	16/12/2013		500.000	
90	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	BASFV49	provvisoria	05/12/2013		200.000	
91	MT097A/11	Cipe	Pisticci	BASFV50	provvisoria	30/12/2013		150.000	
92	MT099A/11	Cipe	Salandra	BASFV52	definitiva	11/11/2013		100.000	
93	MT0100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	BASFV53	definitiva	19/07/2013		400.000	
94	PZ0101A/11	Cipe	Tito	BASFV54	definitiva	04/11/2013		400.000	
95	PZ0102A/11	Cipe	Vaglio	BASFV23	definitiva	24/06/2013		300.000	
96	PZ0103A/11	A	Vaglio	BASFV55	definitiva	18/06/2013		500.000	
97	MT0104A/11	A	Fiume Bradano	BASFV10	definitiva	23/10/2013	339.000		
98	MT0105A/11	A	ss 407 Basentana	BASFV11	provvisoria	22/11/2013	200.000		
99	MT0106A/11	A	SS 106 - Fiume Sinni	BASFV12	definitiva	01/08/2013	200.000		
Aggiudicazione definitiva						**81**	**4.710.703**	**22.048.296**	**5.690.000**
Aggiudicazione provvisoria					**18**				

Totale progetti finanziamento tipo A (MATTM)	**13**
Totale progetti finanziamento CIPE	**55**
Totale progetti finanziamento PO-FESR	**31**

Somme **spese**, al 31 dicembre 2013:

1. **LAVORI €. 8.178.609,42**, di cui:

1.1 €. 2.823.581,49 sui fondi MATTM

1.2 €. 2.745.906,23 sui fondi PO FESR Basilicata

1.3 €. 2.609.121,70 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

2. **ATTIVITA' PROPEDEUTICHE alla progettazione €. 1.093.679,69** di cui:

2.1 €. 128.373,35 sui fondi MATTM

2.2 €. 168.425,96 sui fondi PO FESR Basilicata

2.3 €. 796.880,38 sui fondi Delibera CIPE n.8/2012

3. **"SPESE GENERALI"** di funzionamento: (compenso al Commissario, missioni, straordinari, forniture, etc.) sono stati liquidati **€. 326.339,89** di cui:

3.1 €. 165.068,66 per compenso al Commissario

3.2 €. 18.859,61 per missioni e rimborsi al Commissario

3.3 €. 124.239,14 per lavoro straordinario al personale interno agli Enti pubblici di supporto al Commissario

3.4 €. 18.172,48 per forniture e servizi vari

Tabella n. 5 – Spesa sostenuta su ciascun intervento e per tipologia

Numero	Codice Lavoro	TIPO FINANZIAMENTO	Comune	IMPORTO INTERVENTO	IMPORTO SPESO (Euro)					
					Attività propedeut.	Importo SAL	AVCP	Attività interne	Oneri DPCM 21/01/2011	**TOTALE**
1	MT001B/10	B	Accettura	200.000	12.501,79	0,00	30,00	0,00		**12.531,79**
2	PZ002A/10	Cipe	Acerenza	200.000	1.153,13	0,00	225,00	0,00		**1.378,13**
3	PZ003B/10	B	Albano di Lucania	180.000	6.103,72	0,00	30,00	0,00		**6.133,72**
4	MT004B/10	B	Aliano	60.000	0,00	35.191,05	0,00	0,00		**35.191,05**
5	PZ005B/10	B	Avigliano	200.000	10.459,40	141.312,42	30,00	0,00	4.000,00	**151.801,82**
6	PZ006A/10	Cipe	Avigliano	300.000	3.441,64	0,00	0,00	0,00		**3.441,64**
7	PZ007A/10	Cipe	Avigliano	500.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
8	PZ008A/10	Cipe	Baragiano	300.000	4.944,94	279.479,22	225,00	6.251,49	6.000,00	**290.900,65**
9	PZ009A/10	Cipe	Bella	300.000	10.774,00	0,00	0,00	0,00		**10.774,00**
10	MT010A/10	A	Bernalda	100.000	9.627,47	84.231,34	30,00	1.788,94	2.000,00	**95.677,75**
11	MT011B/10	B	Bernalda	190.000	3.393,78	0,00	0,00	0,00		**3.393,78**
12	MT012A/10	A	Bernalda - Pisticci	500.000	17.283,08	369.223,91	225,00	3.833,94		**390.565,93**
13	PZ013B/10	B	Brienza	200.000	4.341,77	0,00	30,00	0,00		**4.371,77**
14	MT014B/10	B	Calciano	190.000	183,68	114.955,29	30,00	1.780,38		**116.949,35**
15	PZ015B/10	B	Calvello	190.000	0,00	178.523,69	30,00	4.355,31	3.800,00	**182.909,00**
16	PZ016B/10	B	Calvera	330.000	13.164,56	0,00	0,00	0,00		**13.164,56**
17	PZ017B/10	B	Campomaggiore	80.000	5.785,55	34.316,16	30,00	0,00		**40.131,71**
18	PZ018B/10	B	Carbone	215.000	7.396,35	165.912,98	30,00	1.820,81	4.300,00	**175.160,14**
19	PZ019B/10	B	Castelmezzano	100.000	9.196,91	0,00	30,00	0,00		**9.226,91**
20	PZ020A/10	Cipe	Castelmezzano	150.000	18.038,14	0,00	0,00	0,00		**18.038,14**
21	PZ021B/10	B	Chiaromonte	220.000	21.688,88	0,00	0,00	0,00		**21.688,88**
22	MT022B/10	B	Cirigliano	190.000	0,00	155.566,24	30,00	1.412,40	3.800,00	**157.008,64**
23	PZ023A/10	Cipe	Gallicchio	300.000	21.217,15	0,00	225,00	0,00		**21.442,15**
24	MT024B/10	B	Garaguso	190.000	5.033,60	110.278,39	0,00	0,00		**115.311,99**
25	PZ025A/10	Cipe	Genzano di Lucania	300.000	5.548,14	0,00	0,00	0,00		**5.548,14**
26	PZ026B/10	B	Genzano di Lucania	140.000,	301,36	120.301,38	30,00	0,00		**120.632,74**
27	MT027B/10	B	Gorgoglione	190.000	1.808,04	0,00	0,00	0,00		**1.808,04**
28	MT028B/10	B	Grassano	185.000	13.552,00	0,00	0,00	0,00		**13.552,00**
29	MT029A/10	Cipe	Grottole	250.000	30.280,46	0,00	0,00	0,00		**30.280,46**
30	MT030A/10	A Cipe	Irsina	31.703,60 168.296,40	12.720,02	161.264,00	0,00	0,00		**173.984,02**
31	PZ031C/10	B Cipe	Latronico	330.000 170.000	21.600,32	181.344,93	225,00	0,00		**203.170,25**
32	PZ032B/10	B	Lauria	330.000	0,00	190.271,35	225,00	0,00		**190.496,35**
33	PZ033A/10	A	Lauria	450.000	0,00	416.846,97	225,00	0,00		**417.071,97**
34	PZ034B/10	B	Lavello	330.000	4.334,16	118.239,96	225,00	0,00		**122.799,12**
35	PZ035A/10	Cipe	Maschito	400.000	188,72	0,00	225,00	0,00		**413,72**
36	MT036A/10	A	Matera	450.000	20.476,62	139.150,00	0,00	2.477,71		**162.104,33**
37	PZ037A/10	Cipe	Melfi	400.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
38	MT038B/10	B	Miglionico	80.000	1.007,76	0,00	0,00	0,00		**1.007,76**
39	PZ039A/10	A	Missanello	270.000	6.795,36	158.643,10	225,00	1.710,79		**167.374,25**
40	PZ040A/10	Cipe	Moliterno	450.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**

41	MT041A/10	Cipe	Montalbano Jonico	350.000	0,00	0,00	225,00	0,00		**225,00**
42	PZ042B/10	B	Montemurro	180.000	8.203,35	113.460,71	30,00	2.775,59	3.600,00	**124.469,65**
43	PZ043A/10	Cipe	Muro Lucano	300.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
44	PZ044B/10	B	Nemoli	130.000	3.311,18	118.675,46	0,00	0,00		**121.986,64**
45	MT045A/10	Cipe	Nova Siri	500.000	7.138,62	0,00	0,00	0,00		**7.138,62**
46	MT046A/10	Cipe	Oliveto Lucano	400.000	8.590,11	0,00	0,00	0,00		**8.590,11**
47	PZ047B/10	B	Oppido Lucano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
48	PZ048A/10	Cipe	Oppido Lucano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
49	PZ049A/10	Cipe	Palazzo San Gervasio	100.000	2.522,97	56.956,91	0,00	1.198,75	2.000,00	**60.678,63**
50	PZ050A/10	Cipe	Picerno	250.000	36.368,39	158.624,45	0,00	0,00		**194.992,84**
51	PZ051A/10	Cipe	Picerno	400.000	70.369,55	0,00	0,00	0,00		**70.369,55**
52	PZ052A/10	Cipe	Pignola	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
53	MT053A/10	A	Pomarico	200.000	8.229,31	179.540,85	0,00	2.579,89	4.000,00	**190.350,05**
54	PZ054B/10	B	Potenza	190.000	5.000,00	125.435,03	30,00	3.053,08	3.800,00	**133.518,11**
55	PZ055A/10	Cipe	Potenza	450.000	33.782,57	0,00	0,00	0,00		**33.782,57**
56	PZ056B/10	B	Rapolla	200.000	12.348,51	73.453,76	0,00	0,00		**85.802,27**
57	PZ057B/10	B	Rionero in Vulture	340.000	8.000,00	0,00	0,00	0,00		**8.000,00**
58	PZ058A/10	Cipe	Ripacandida	200.000	13.799,32	66.803,54	30,00	0,00		**80.632,86**
59	PZ059A/10	Cipe	Rivello	350.000	6.626,59	0,00	225,00	2.627,14		**9.478,73**
60	MT060A/10	Cipe	Rotondella	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
61	PZ061B/10	B	San Costantino Albanese	200.000	4.668,69	185.848,74	30,00	1.782,50	4.000,00	**192.329,93**
62	PZ062A/10	Cipe	San Fele	350.000	3.524,06	329.392,25	225,00	3.068,10	7.000,00	**336.209,41**
63	PZ063A/10	Cipe	San Martino d'Agri	300.000	7.493,09	79.142,11	225,00	2.603,21		**89.463,41**
64	MT064A/10	Cipe	San Mauro Forte	400.000	24.435,84	248.582,41	0,00	0,00		**273.018,25**
65	MT065A/10	Cipe	San Mauro Forte	400.000	26.910,23	0,00	0,00	0,00		**26.910,23**
66	PZ066A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	600.000	38.332,42	0,00	0,00	0,00		**38.332,42**
67	PZ067A/10	Cipe	Sant'Angelo Le Fratte	100.000	4.722,91	0,00	0,00	0,00		**4.722,91**
68	PZ068A/10	Cipe	Sant'Arcangelo	200.000	0,00	159.094,49	30,00	1.952,56	4.000,00	**165.077,05**
69	PZ069A/10	Cipe	Sarconi	200.000	4.581,48	111.143,34	30,00	0,00		**115.754,82**
70	PZ070B/10	B	Sasso di Castalda	200.000	5.406,89	74.804,30	30,00	0,00		**80.241,19**
71	PZ071B/10	B	Satriano di Lucania	220.000	0,00	163.779,32	30,00	0,00		**163.809,32**
72	MT072B/10	B	Stigliano	255.000	0,00	243.563,10	225,00	4.171,00	5.100,00	**247.959,10**
73	PZ073A/10	Cipe	Terranova di Pollino	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
74	PZ074A/10	Cipe	Tito	400.000	9.953,79	366.000,15	0,00	6.993,97		**382.947,91**
75	PZ075A/10	Cipe	Tolve	350.000	9.961,46	0,00	0,00	0,00		**9.961,46**
76	PZ076C/10	B	Trecchina	300.000	1.773,64	270.548,74	225,00	4.359,88		**276.907,26**
		Cipe		200.000						
77	PZ077A/10	Cipe	Trecchina	80.000	0,00	68.795,45	30,00	1.583,03	1.600,00	**70.408,48**
78	MT078A/10	A	Tricarico	800.000	6.347,36	392.907,01	30,00	6.790,00	5.754,83	**406.074,37**
		A			7.852,42	150.857,46	225,00	5.649,97		**164.584,85**
79	MT079A/10	Cipe	Tricarico	380.000	25.241,57	0,00	0,00	0,00		**25.241,57**
80	PZ080A/10	Cipe	Trivigno	400.000	28.844,01	0,00	225,00	0,00		**29.069,01**
81	MT081A/10	A	Tursi	700.000	23.280,28	604.389,68	225,00	15.825,29	14.000,00	**643.720,25**
82	MT082A/10	Cipe	Valsinni	400.000	22.555,95	0,00	0,00	0,00		**22.555,95**
83	PZ083A/10	Cipe	Venosa	350.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
84	PZ084A/10	Cipe	Viggianello	250.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
85	MT085A/10	A	Bernalda	300.000	21.127,39	178.189,25	600,00	13.162,39		**213.079,03**

		Cipe		2.700.000	141.171,41	21.296,00	225,00	0,00		**162.692,41**
86	PZ086A/11	Cipe	Castelluccio Inferiore	2.000.000	20.891,47	0,00	0,00	0,00		**20.891,47**
87	MT087A/11	Cipe	Grassano	400.000	2.064,74	0,00	0,00	802,05		**2.866,79**
88	MT088A/11	Cipe	Miglionico	200.000	8.081,72	0,00	0,00	58,97		**8.140,69**
89	MT089A/11	A	Nova Siri	200.000	906,40	0,00	30,00	0,00		**936,40**
90	PZ090A/11	Cipe	Pignola	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
91	MT091A/11	A	Bacino del Fiume Agri	500.000	523,00	0,00	225,00	0,00		**748,00**
92	PZ092A/11	Cipe	Chiaromonte	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
93	MT093A/11	Cipe	Colobraro	500.000	28.044,38	0,00	0,00	143,71		**28.188,09**
94	PZ094A/11	Cipe	Maratea	700.000	0,00	0,00	375,00	0,00		**375,00**
95	PZ095A/11	Cipe	Melfi	500.000	6.000,00	0,00	0,00	0,00		**6.000,00**
96	MT096A/11	Cipe	Montalbano Jonico	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
97	MT097A/11	Cipe	Pisticci	150.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
98	PZ098A/11	Cipe	Rapone	180.000	9.106,45	0,00	0,00	0,00		**9.106,45**
99	MT099A/11	Cipe	Salandra	100.000	0,00	82.572,93	0,00	0,00		**82.572,93**
100	MT100A/11	Cipe	San Giorgio Lucano	400.000	21.320,20	0,00	0,00	113,19		**21.433,39**
101	PZ101A/11	Cipe	Tito	400.000	20.875,48	0,00	0,00	0,00		**20.875,48**
102	PZ102A/11	Cipe	Vaglio	300.000	10.757,97	140.554,00	0,00	87,10		**151.399,07**
103	PZ103A/11	Cipe	Vaglio	500.000	18.290,02	135.104,02	0,00	131,73		**153.525,77**
104	MT104A/11	A	Provincia di Matera	339.000	0,00	124.041,58	225,00	0,00		**124.266,58**
105	MT105A/11	A	Ferrandina, Salandra, Calciano	200.000	0,00	0,00	0,00	0,00		**0,00**
106	MT106A/11	A	Rotondella e Tursi - Bacino del Fiume Sinni	200.000	0,00	0,00	225,00	0,00		**225,00**
				Totale Euro	**1.093.679,69**	**8.178.609,42**	**6.840,00**	**106.944,87**	**78.754,83**	**9.390.073,98**

4. ACCREDITAMENTI ALLA CONTABILITA' SPECIALE DEL COMMISSARIO

Come richiamato, gli importi programmati per la realizzazione degli interventi di cui all'allegato 1 - elenco "A" dell'accordo di programma, ammontavano complessivamente ad €. 26.935.000,00 di cui:

- €. 20.200.000,00 con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191
- €. 6.735.000,00 del P.O. FERS Basilicata 2007-2013

L'Atto integrativo ha previsto un ulteriore impegno di €. 8.269.00,00 da finanziare con fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191

La più volte citata Deliberazione CIPE n. 8 del 20.01.2012 ha poi indicato come nuova fonte di finanziamento il FSC ed i programmi PAN e PAIN.

I primi accreditamenti da parte del **MATTM** sono intervenuti a partire da fine giugno del 2011, e sono avvenuti come segue:

-1° accreditamento: di €. 501.378,98 in data 29.06.2011
-2° accreditamento: di €. 3.356.186,08 in data 15.12.2011
-3° accreditamento: di €. 960.361,88 in data 19.09.2012 (CIPE)
-4° accreditamento: di €. 663.138,54 in data 19.09.2012
-5° accreditamento : di €. 663.138,54 in data 10.12.2012 (CIPE)
-6° accreditamento : di €. 541.166,81 in data 10.12.2012 (CIPE)

per un totale di €. 6.685.370,83 di cui €. 2.164.667,23 derivante dalla delibera CIPE n. 8/2012 e pari all'intero finanziamento programmato a carico del MATTM.

La **Regione Basilicata** ha effettuato il suo primo accreditamento in data 17.02.2012 per €. 371.574,00, in data 11.09.2012 ha provveduto ad effettuare un secondo accreditamento di €. 638.676,00, in data 25.02.2013 ha provveduto ad accreditare il terzo di €. 918.593,60, in data 29.11.2013 ha infine accreditato €. 1.038.214,47 per un totale di €. **2.967.058,07** sui fondi FESR a fronte di €. **6.735.000,00.**

Mentre il MATTM, come sopra riportato, ha tempestivamente accreditato €. 2.164.667,26, la **Regione Basilicata** solo in data 30.09.2013 ha provveduto ad accreditare un primo importo di €. 1.000.000,00 sui fondi CIPE ed in data 27.11.2013 un secondo importo di €. 400.000,00 a fronte di € 23.948.296,40 previsto ed assegnato con la citata delibera CIPE n. 8/2012 anche in contrasto con quanto previsto dalla deliberazione n. 286 in data 12 marzo 2013 avente ad oggetto: "Piano Nazionale per il sud - Delibera CIPE n. 8/2012. ASSEGNAZIONE DI RISORSE A INTERVENTI DI CONTRASTO DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DI RILEVANZA STRATEGICA REGIONALE NEL MEZZOGIORNO.

DGR 860.2012- Art. 6 e 7. Modalità di trasferimento delle risorse", con la quale la stessa Giunta della Regione Basilicata aveva, tra l'altro:

- *preso atto della Relazione Annuale aggiornata al 31.12.2012* redatta dal Commissario Straordinario delegato *da cui si evince la situazione finanziaria degli interventi e l'impegno a soddisfare la prescrizione dell'art. 6 della delibera CIPE 8/2012 nell'ipotesi di copertura delle necessità finanziarie di €.10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad €. 11.783.629,18 nel primo semestre del 2014;*

e ***deliberato***

- *di dare atto che con successivo provvedimento sarà trasferito sulla contabilità speciale del Commissario Straordinario l'importo di €.10.000.000,00 nel corso dell'anno 2013 e i restanti fondi pari ad €.11.783.629,18 nel primo semestre dell'anno 2014.*

Tabella 5 – Riepilogo somme accreditate al 31/12/2013

Numero	Data	MATTM	CIPE/Regione	Regione Basilicata PO-FESR 07/13	Importo
		codice A		codice B	
1	29/06/2011	€ 501.378,98			€ 501.378,98
2	15/12/2011	€ 3.356.186,08			€ 3.356.186,08
3	17/02/2012			€ 371.574,00	€ 371.574,00
4	11/09/2012			€ 638.676,00	€ 638.676,00
5	19/09/2012		€ 960.361,88		€ 960.361,88
6	19/09/2012	€ 663.138,54			€ 663.138,54
7	10/12/2012		€ 663.138,54		€ 663.138,54
8	10/12/2012		€ 541.166,81		€ 541.166,81
9	25/02/2013			€ 918.593,60	€ 918.593,60
10	30/09/2013		€ 1.000.000,00		€ 1.000.000,00
11	27/11/2013		€ 400.000,00		€ 400.000,00
12	29/11/2013			€ 1.038.214,47	€ 1.038.214,47
		€ 4.520.703,60	**€ 3.564.667,23**	**€ 2.967.058,07**	**€ 11.052.428,90**

5. LA GESTIONE DEL PROGRAMMA AL 31 dicembre 2013

In merito allo stato di attuazione dell'A.d.P. e quindi della delibera CIPE n. 8 sopra richiamata che ha recepito e confermato la programmazione dei due atti sottoscritti dal MATTM e dalla Regione Basilicata, si è riferito tempo per tempo al Ministero con relazioni trimestrali e con la Relazione annuale al Parlamento.

La deliberazione n. 8 in data 20 gennaio 2012 ha approvato il programma di seguito riportato al netto degli interventi finanziati con il P.O. FESR Basilicata 2007/2013.

Da detta deliberazione si rileva sostanzialmente quanto segue:

1. gli interventi da finanziare con fondi regionali mantengono inalterata la fonte di finanziamento che è il PO-FESR Basilicata 2007-2013 per complessivi €. 6.735.000,00;
2. gli interventi che trovano copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191 sono i primi 12 e parzialmente il 13° per un importo complessivo di €. 6.685.370,83 tutti accreditati;
3. Tutti gli altri interventi, già programmati con copertura finanziaria sui fondi (MATTM) di cui all'art.2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n.191, trovano ora copertura sul Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) per €. 23.948.296,40 rinvenienti dai PAR e dai PAIN;
4. Detti fondi, come riportato al punto 7.2 della deliberazione, saranno accreditati alla Regione Basilicata per essere da questa poi, nel rispetto del patto di stabilità, trasferiti al Commissario con le modalità e secondo le quote richiamati al punto 7.3;
5. L'intero programma costruttivo doveva definire obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 30 giugno 2013, successivamente prorogato al 31 dicembre 2013 ed ulteriormente prorogato, nella seduta del 17 dicembre u.s. del Comitato, al 31 dicembre 2014, pena la revoca dei finanziamenti!

La delibera di G.R. n.286/2013 e la nota del Direttore generale del MISE n.1859 in data 11.02.2013, che chiarisce che: "…*non è impedito* ai Commissari Straordinari di procedere alla *formalizzazione di contratti nei confronti di soggetti terzi nel limite delle somme assegnate a ciascun intervento…",* hanno consentito pur in attesa del trasferimento delle risorse, l'approvazione di nuovi progetti anche oltre le somme effettivamente accreditate.

La dimensione delle previsioni degli interventi, per lo più di modesta entità, e la stessa tipologia di opere, rendono abbastanza brevi i tempi di esecuzione dei relativi lavori, diventa quindi importante il rispetto dei tempi di accreditamento che la G.R. si è data al fine di garantire i pagamenti dei tempi contrattualmente previsti e che le normative europee sanciscono a carico delle Amministrazioni.

Effettuata la aggiudicazione degli appalti le spesa si determina in un arco di tempo abbastanza breve , massimo sei mesi e quindi l'obbligo a "pagare" si concentra in un arco di tempo ridotto, non in "anni".

Al rischio di determinare condizioni di "debito" per l'Amministrazione, se non venisse garantito il pagamento degli stati d'avanzamento dei lavori, con la necessaria tempestiva copertura con l'accreditamento preventivo delle somme si aggiungerebbe il danno, per l'economia reale del territorio, l'accrescersi del "costo" delle opere per gli appaltatori in conseguenza dei ritardi nei pagamenti.

Situazione sino ad oggi scongiurata per tutti gli interventi attivati ed in corso. Rischio che comincia ad assumere caratteri "concreti" in quanto, ad oggi, risulta pervenuto solo un parziale modesto accredito pari ad € 1.400.000,00 da parte della Regione Basilicata, a fronte degli impegni assunti con la richiamata D.G.R. n. 286 del 12.03.2013. Ove non dovesse verificarsi una immediata e tempestiva modifica di comportamento si sarà costretti a sospendere le attività.

Di non minore importanza è la definizione della eventuale proroga dell'incarico a Commissario Straordinario delegato, la cui scadenza è fissata al 20 gennaio prossimo.

A fronte della necessità ed obbligo di dare sollecita attuazione degli interventi programmati, permangono situazioni di evidente contrasto:

- Ritardo nel trasferimento delle risorse da parte della Regione Basilicata;
- Scadenza dell'incarico senza alcuna indicazione per una eventuale proroga;
- Mancata risposta alla richiesta di devoluzione delle risorse programmate per Moliterno;
- Rischio di non poter disporre più delle pur modeste collaborazioni poste a disposizione da Enti pubblici quali l'Autorità di Bacino della Basilicata ed il Consorzio di Bonifica.

6. BILANCIO ECONOMICO RELATIVO ALLA GESTIONE COMMISSARIALE

La complessiva gestione della programmazione è, come ovvio, fortemente influenzata dalla effettiva **disponibilità** delle risorse oltre che dalla organizzazione funzionale a disposizione, necessaria, per garantire una puntuale ed efficace spesa.

Quanto alle risorse, la loro messa a disposizione, del tutto indipendente dalla volontà del Commissario, si è verificata con entità e tempi ad esso estranee condizionandone non poco decisioni e scelte.

Solo dopo il primo accreditamento di fondi, infatti, è stato possibile procedere all'avvio concreto delle attività ed alle prime spese indispensabili per dare un senso all'attuazione.

Dopo il secondo accreditamento da parte del MATTM, è stato possibile autorizzare indagini ed incarichi propedeutici per le progettazioni ed alle progettazioni stesse e procedere di conseguenza all'approvazione dei primi progetti individuati come prioritari o, dopo quello della Regione Basilicata, approvare i progetti finanziati dai fondi PO FESR 2006 2013 Basilicata.

La TABELLA RIASSUNTIVA sullo stato di attuazione della spesa sugli interventi previsti dall'A.d.P. al 31 dicembre 2013, evidenzia il succedersi temporale della "spesa" e la disponibilità di cassa. Preme evidenziare che, negli ultimi mesi ed in relazione alla esecuzione degli interventi, la spesa è notevolmente cresciuta e, ove non dovessero determinarsi nuovi accreditamenti, potrebbe verificarsi il temuto spostamento in negativo tra disponibilità e spesa.

OMISSIS DA PAG. 32 A PAG.65

7. GRAFICI DI SINTESI

Al fine di rendere meglio visibile l'attività della struttura del Commissario si riportano di seguito n. 4 rappresentazioni grafiche relative a :

Grafico n. 1: Fonti di finanziamento e percentuali di incidenza

Grafico 1 - Fonti di finanziamento



MATTM	**€ 4.520.703,60**
MATTM - CIPE (Del. 8/2012)	**€ 2.164.667,23**
Regione Basilicata PO-FESR	**€ 6.735.000,00**
Regione Basilicata - CIPE (Del. 8/2012)	**€ 21.783.629,17**

Grafico 2 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed accreditate



MATTM

programmate	**€ 4.520.703,60**	
accreditate	**€ 4.520.703,60**	100%



MATTM - CIPE

programmate	**€ 2.164.667,23**	
accreditate	**€ 2.164.667,23**	100%



Regione Basilicata - PO-FESR

programmate	**€ 6.735.000,00**	
accreditate	**€ 2.967.058,07**	44%



Regione Basilicata (CIPE)

programmate	**€ 21.783.629,17**	
accreditate	**€ 1.400.000,00**	6%

Grafico 3 - Rapporto percentuale tra somme programmate ed impegnate



MATTM

programmate	**€ 4.520.703,60**	
impegnate	**€ 4.520.703,60**	100%



Regione Basilicata - PO-FESR

programmate	**€ 6.735.000,00**	
impegnate	**€ 6.735.000,00**	100%

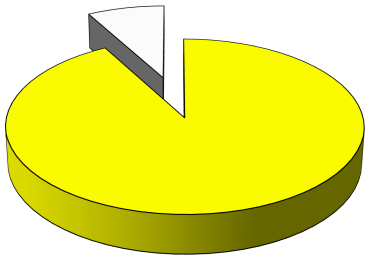

Regione Basilicata - MATTM (Del. CIPE 8/2012)

programmate	**€ 23.948.296,40**	
impegnate	**€ 22.002.375,82**	92%

Grafico 4 - Rapporto percentuale tra somme accreditate e spese



MATTM

accreditate	**€ 4.520.703,60**	
spese	**€ 2.951.954,84**	65%



Regione Basilicata - PO-FESR

accreditate	**€ 2.967.058,07**	
spese	**€ 2.914.332,19**	98%

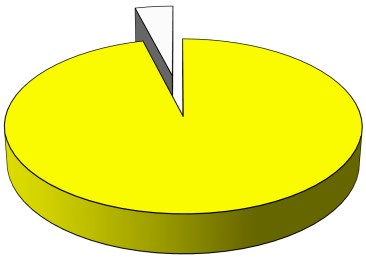

Regione Basilicata - MATTM (Del. CIPE 8/2012)

accreditate	**€ 3.564.667,23**	
spese	**€ 3.406.002,08**	96%

8. CRITICITÀ

8.1 Tutta l'attività sino ad ora svolta potrebbe essere compromessa dal mancato accreditamento tempestivo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 8/2012 che, sono state fatte transitare attraverso la Regione Basilicata per essere trasferite alla contabilità straordinaria del Commissario, inopinatamente sottoposte anch'esse al "patto di stabilità"!
Peccato che il fragile sistema idrogeologico della Basilicata, come delle altre regioni, non si confronta con il patto di stabilità né i dissesti ed i conseguenti danni, di gran lunga più costosi in termini di successivi rimedi, per non parlare di pericoli per la vita umana il cui valore non è in alcun modo misurabile, si attivano in relazione alle esigenze contabili della Regione. L'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo di programma, con il riconoscimento di urgenza e priorità per gli interventi in esso previsti, non consente, in termini di cosciente responsabilità, alcuna motivazione nel ritardo della esecuzione delle opere.
I danni verificati nel recente passato **nuovamente** anche in Basilicata, dovrebbero far "diversamente" valutare i costi del rispetto di alcune decisioni assunte a livello europeo!
La "difesa del suolo", per evitare il costante aggravamento dei rischi idrogeologici, non può sottostare al "patto di stabilità", perché … è una **contraddizione in termini**: *non si può stabilizzare la spesa se non si stabilizza il suolo,* a meno che non si è disposti a pagarne il prezzo altissimo in termini di vittime e danni … e, a quel punto verrebbe da dire: basta ipocrisie e smettiamola di piangere su …
Con riferimento all' AdP, si valuti responsabilmente, da parte di chi regola le norme ed opera le scelte, il rischio collegato alla sospensione di quanto sino ad ora avviato ed a rischio per il ritardo nella messa a disposizione di somme previste, accreditate alla Regione, ma solo molto limitatamente accreditate alla contabilità speciale del Commissario, che dopo aver operato, con la approvazione dei progetti e l'affidamento dei relativi lavori, sulla base di impegni formalmente assunti da parte della Giunta regionale, corre, ora, il rischio di non poter onorare gli impegni assunti e soprattutto garantire la realizzazione delle opere!

8.2 A questa situazione, di imprevedibilità della **disponibilità reale** delle risorse per garantire il pagamento delle opere appaltate, si aggiunge ora anche la mancata decisione da parte del Governo nazionale della "sorte" dei Commissari: **proroga o non proroga**.
Se i ritardi sono universalmente riconosciuti in capo alla responsabilità del mancato accreditamento delle risorse, a sommesso parere dello scrivente, gli incarichi dovrebbero essere tempestivamente prorogati sino al compimento delle opere o sino al termine dei

tempi necessari per completare le opere, a decorrere dall'avvenuto accreditamento di tutte le risorse.
Ove i pareri, nei luoghi delle scelte, siano diversi da quello ora espresso sarebbe opportuno dare adeguate direttive per il trasferimento di atti, risorse, se disponibili, responsabilità sulle delicate fasi di realizzazione, completamenti, collaudi, consegna delle opere ai soggetti beneficiari.

8.3 In merito poi al **progetto**, mai avviato, codice **PZ040A/10** che interessa il Comune di Moliterno, il Commissario non ha potuto attivare alcuna iniziativa, avendo richiesto, al Comitato di indirizzo e controllo, a far data dal 27 maggio 2011, senza alcuna risposta, l'autorizzazione a destinare ad altro intervento le somme programmate per l'"Intervento di consolidamento frana e ripristino sede stradale SP ex SS 103 Km. 8+400-8+500". Codice "PZ040A/10".

8.4 Il Commissario ha potuto sino ad ora operare con il supporto di poche ma preziose ed indispensabili collaborazioni nell'ambito delle disponibilità, a titolo gratuito, di Enti, Strutture Pubbliche e Società pubbliche. Al Personale impegnato è stato unicamente riconosciuto il lavoro straordinario prestato, in coerenza con quanto previsto dal decreto di nomina del Commissario. L'auspicio è che queste collaborazioni siano ancora possibili, sia in conseguenza della disponibilità di Enti a confermarle anche per il 2014, sia per il permanere della norma che le rende possibili.

Matera, 31 dicembre 2013

Il Commissario straordinario delegato
f.to Ing. Francesco Saverio ACITO
